ID	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	**LAVORI**	**190 giorni**	**lun 07/01/13**	**lun 15/07/13**	
2	Installazione cantiere	7 giorni	lun 07/01/13	dom 13/01/13	
3	**OPERE CIVILI**	**60 giorni**	**lun 14/01/13**	**gio 14/03/13**	
4	Taglio alberi e arbusti	3 giorni	lun 14/01/13	mer 16/01/13	2
5	Scavo platea	5 giorni	gio 17/01/13	lun 21/01/13	4
6	Consolidamento fondazione	3 giorni	mar 22/01/13	gio 24/01/13	5
7	Magrone	1 giorno	ven 25/01/13	ven 25/01/13	6
8	Casseratura platea	7 giorni	sab 26/01/13	ven 01/02/13	7
9	Armatura Platea e dispersori terra	7 giorni	sab 02/02/13	ven 08/02/13	8
10	**Controllo Armatura**	1 giorno	gio 07/02/13	gio 07/02/13	9FI-2 giorni
11	Getto cls	2 giorni	sab 09/02/13	dom 10/02/13	9
12	**Prelievo cubetti**	1 giorno	lun 11/02/13	lun 11/02/13	11
13	Casseratura muretti	5 giorni	lun 11/02/13	ven 15/02/13	11
14	Armatura muretti	5 giorni	sab 16/02/13	mer 20/02/13	13
15	**Controllo Armatura**	1 giorno	mar 19/02/13	mar 19/02/13	14FI-2 giorni
16	Getto cls	2 giorni	gio 21/02/13	ven 22/02/13	14
17	**Prelievo cubetti**	1 giorno	sab 23/02/13	sab 23/02/13	16
18	Realizzazioni portali in acciaio in officina	15 giorni	lun 14/01/13	lun 28/01/13	2
19	Finiture	4 giorni	sab 23/02/13	mar 26/02/13	16
20	Posa e completamento portali in acciaio	10 giorni	mar 05/03/13	gio 14/03/13	16FI+10 giorni
21	Finiture civili	7 giorni	lun 25/02/13	dom 03/03/13	
22	**OPERE IDRAULICHE**	**170 giorni**	**lun 14/01/13**	**mar 02/07/13**	
23	Realizzazione Filtri in officina	90 giorni	lun 14/01/13	sab 13/04/13	2
24	**Controllo Filtri**	1 giorno	sab 23/02/13	sab 23/02/13	23FI-50 giorni
25	**Controllo Filtri**	1 giorno	lun 25/03/13	lun 25/03/13	23FI-20 giorni
26	**Controllo Filtri**	1 giorno	mar 09/04/13	mar 09/04/13	23FI-5 giorni
27	Posa filtri	10 giorni	dom 14/04/13	mar 23/04/13	23
28	Predisposzione ragni tubazioni	40 giorni	lun 14/01/13	ven 22/02/13	2
29	Installazione tubazioni adduttrici esterne SU PORTALI	5 giorni	ven 15/03/13	mar 19/03/13	28;20
30	Scavo pozzetto acque lavaggio	2 giorni	mer 20/03/13	gio 21/03/13	29
31	Casseratura pozzetto lavaggio	3 giorni	ven 22/03/13	dom 24/03/13	30
32	Armatura Pozzetto lavaggio	3 giorni	lun 25/03/13	mer 27/03/13	31
33	**Controllo Armatura**	1 giorno	mer 27/03/13	mer 27/03/13	32FI-1 giorno
34	Getto cls	2 giorni	gio 28/03/13	ven 29/03/13	33
35	**Prelievo cubetti**	1 giorno	sab 30/03/13	sab 30/03/13	34
36	Predisposizione e posa soletta carabile	3 giorni	gio 11/04/13	sab 13/04/13	34FI+12 giorni
37	Installazione tubazioni esterne	20 giorni	mer 24/04/13	lun 13/05/13	29;27
38	Installazioni tubazioni interne	5 giorni	lun 14/01/13	ven 18/01/13	2
39	Connessione con tubazione aspirazione pompe	1 giorno	sab 19/01/13	sab 19/01/13	38
40	Scavo per tubazioni interrate nell'impianto	3 giorni	mar 14/05/13	gio 16/05/13	3;37
41	Posa tubazioni interrate e ripristini interni nell'impianto	10 giorni	ven 17/05/13	dom 26/05/13	40
42	Scavo per tubazioni interrate in strada lato impianto	3 giorni	lun 27/05/13	mer 29/05/13	41
43	Posa tubazioni interrate e ripristiniin strada lato impianto	12 giorni	gio 30/05/13	lun 10/06/13	42
44	Scavo per tubazioni interrate in strada lato opposto impianto	3 giorni	mar 11/06/13	gio 13/06/13	43
45	Posa tubazioni interrate e ripristiniin strada lato opposto impianto	9 giorni	ven 14/06/13	sab 22/06/13	44
46	Riempimento filtri con GAC	10 giorni	dom 23/06/13	mar 02/07/13	45
47	**OPERE ELETTRICHE**	**135 giorni**	**lun 14/01/13**	**mar 28/05/13**	
48	Quadro elettrico principale QGL e n°5 QLF in officina	30 giorni	lun 14/01/13	mar 12/02/13	2
49	Posa Quadro elettrico principale QGL	2 giorni	mer 13/02/13	gio 14/02/13	48
50	Canalizzazioni interne	5 giorni	ven 17/05/13	mar 21/05/13	40
51	Quadri locali	15 giorni	mar 14/05/13	mar 28/05/13	37;27
52	Cablaggio macchine	7 giorni	ven 15/02/13	gio 21/02/13	49;39
53	**PROVE FUNZIONAMENTO IMPIANTO**	**7 giorni**	**mer 03/07/13**	**mar 09/07/13**	**47;22**
54	**RIPRISTINI STRADALI (Esecuzione da concordare con gli organi Competenti) Vedi Art. 18 C.S.A.**	**4 giorni**	**dom 23/06/13**	**mer 26/06/13**	
55	Fresatura	1 giorno	dom 23/06/13	dom 23/06/13	45;41
56	Rifacimento manto d'usura	2 giorni	lun 24/06/13	mar 25/06/13	55
57	Segnaletica stradale orizzontale e verticale	1 giorno	mer 26/06/13	mer 26/06/13	56
58	Smobilizzo cantiere	6 giorni	mer 10/07/13	lun 15/07/13	53;54

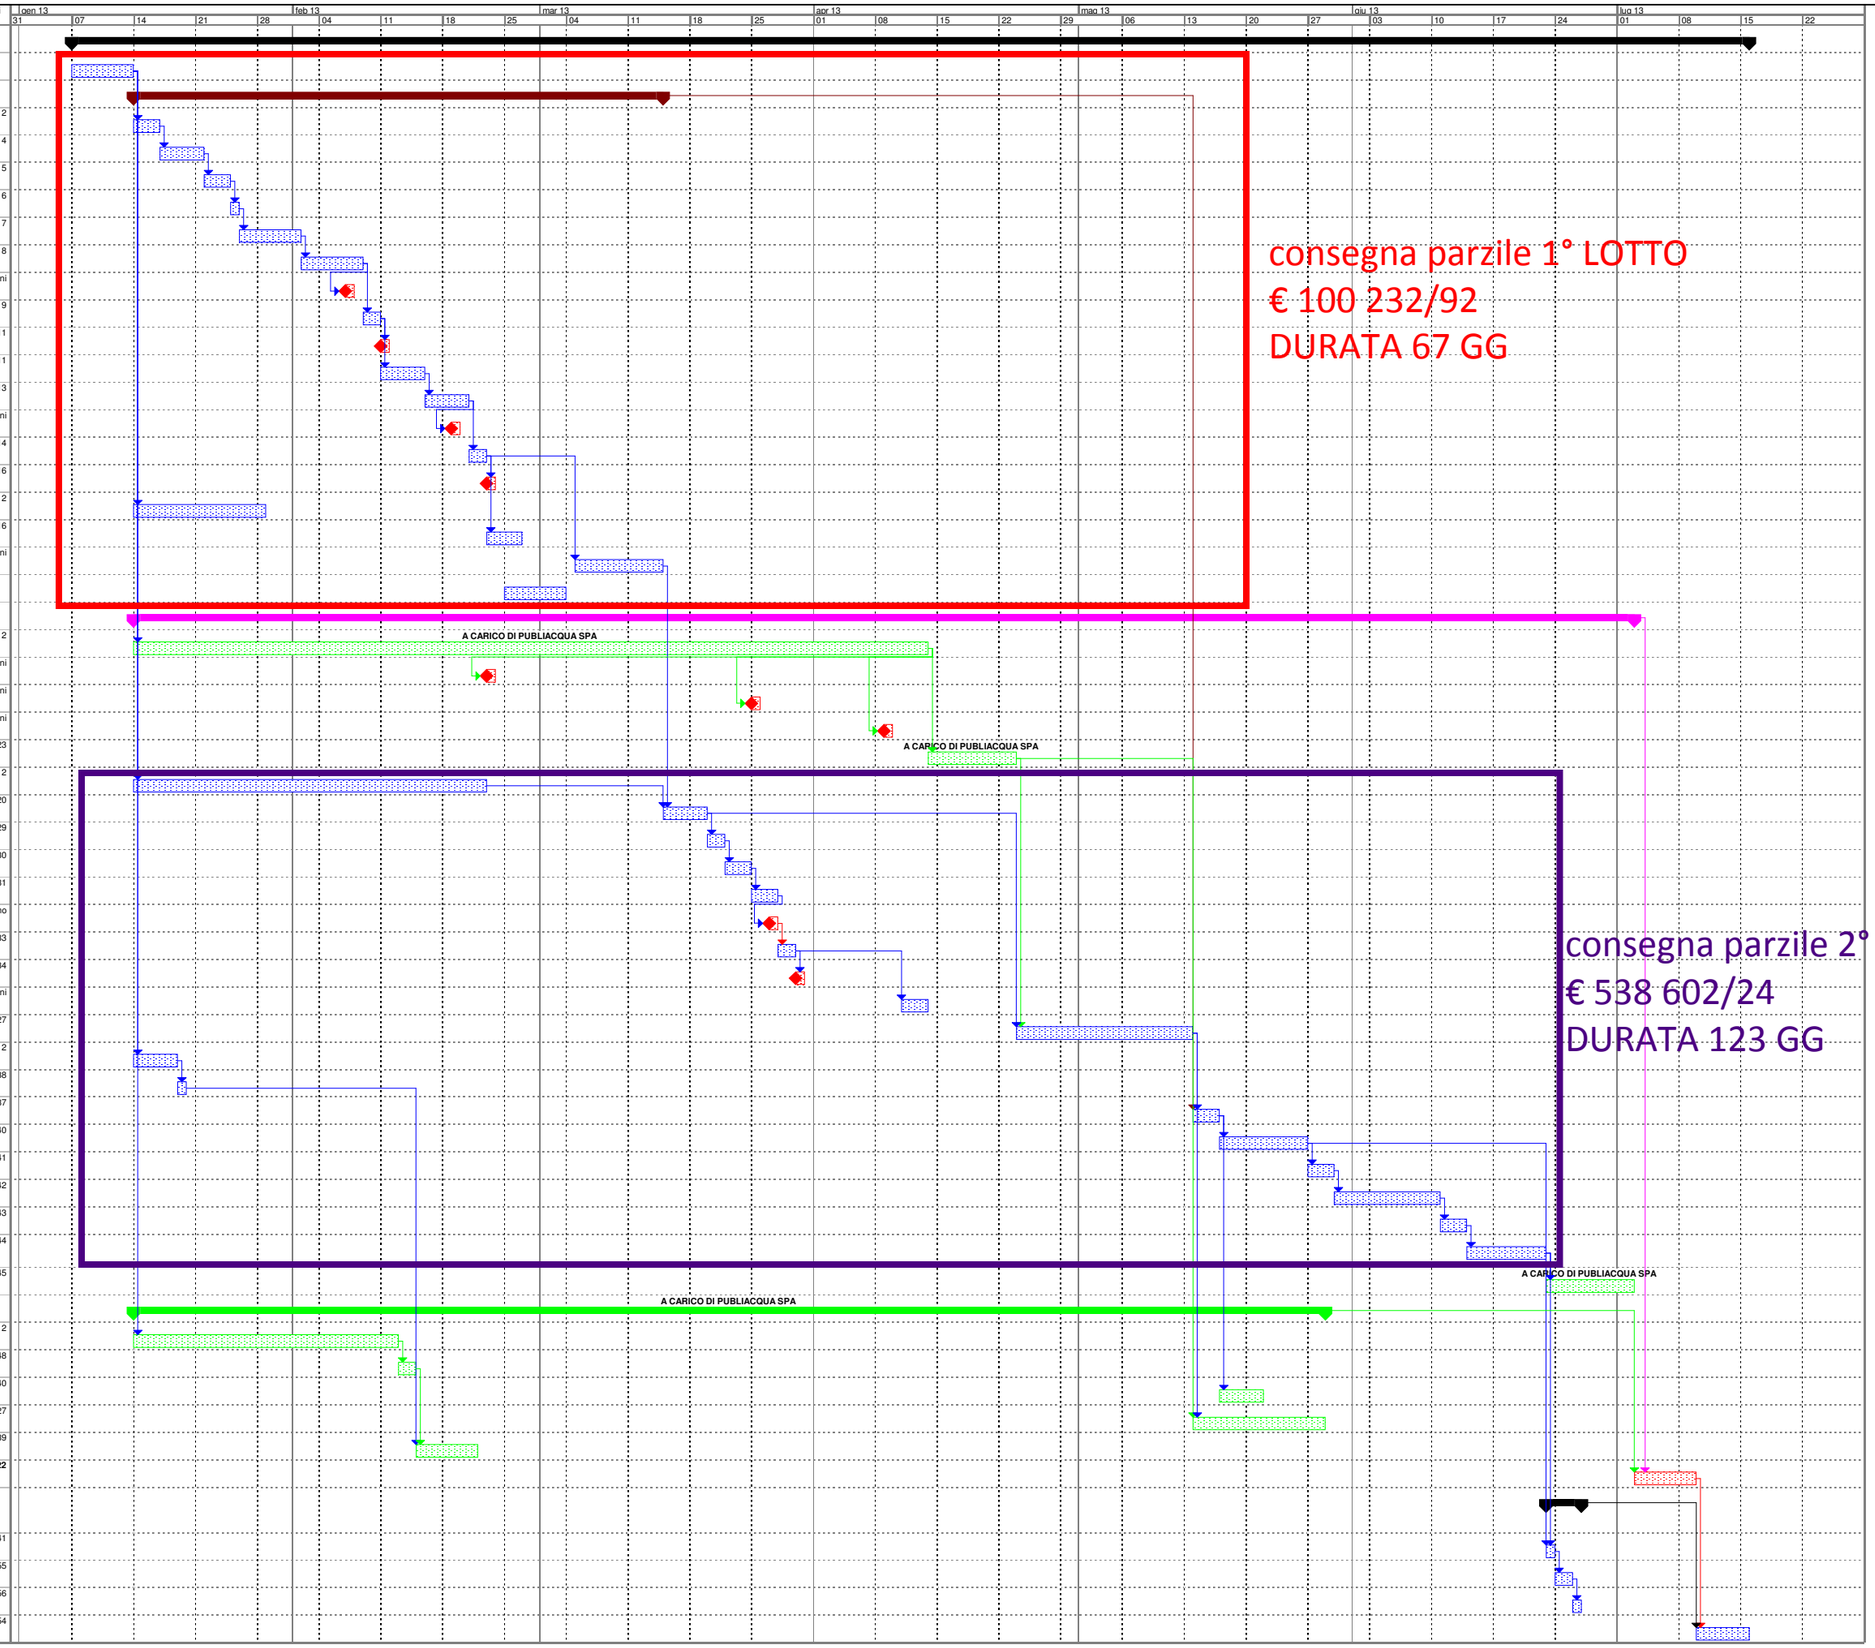

ago 13					set 13				ott 13					nov 13				dic 13					gen 14					feb 14				mar 14					apr 14			
29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21
